





# **Grupo 7 SPRINT 1**

Nilson Andres Saavedra Gonzalez

# Proyecto creación de portafolio de muebles







#### 1. Integrantes del equipo

NILSON ANDRES SAAVEDRA GONZALEZ

### 2. Diseño de product backlog

Para este ejercicio utilizaré un product backlog diseñado por mi, con alguno procesos que automatizan tareas, desarrollados en Apps Script como el informe de seguimiento o retrospectiva, registro al producto Backlog, bitácora de cambios, envíos email por cambios de estado de tareas o asignación de tareas, entre otros.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RepATGZ1gADt-CtU0dHDf7XjbbtRas-vFaQ-HtF8oPQ/edit?usp=sharing

	● Main		Cantidad de tareas Duración			Transcurrido	Transcurrido			Finalizada 🔻				
100	Mision TIC 2022	PRO	PRODUCT BACKLOG		Sprint 1 • 0		7				0			
ID	Plan de Trabajo	Área Principal	Titulo Identificación Tarea	Tipo tarea	Prioridad	Complejidad	Estimación en Horas	Fecha programada de entrega	Fecha de inicio real	Tiempo desde inicio	Estado tarea	Avance	Fecha cambio de estado	Bitácora de observaciones
	-	-		~	~	*					~			
	-	~		~	▼	₩					▼			
	-	~		~	▼	₩					▼			
	-	~		~	▼	~					▼			
	-	~		~	▼	▼					▼			
	-	~		~	▼	₩					▼			
	-	~		~	▼	₩					▼			
	-	~		~	▼	~					▼			
	-	~		-	▼	*					▼			
	-	~		~	▼	₩					▼			
	-	₩		▼	~	₩					▼			
	-	-		-	▼	*					~			
	-	~		-	₩	₩					~			
	-	~		~	▼	₩					▼			
	-	▼		▼	▼	*					▼			







#### 3. Desarrollo del product backlog

A continuación se desarrolla el producto backlog del Spring 1, Teniendo en cuenta las metodologías de números de Fibonacci para cuantificar la complejidad, en este caso por estar solo no se realiza Planning Poker (esta dinámica requiere varios participantes)

Mísion TIC2022				Cantidad de tareas		Duración	Transcurrido				Finalizada 🔻			
		PRODUC	Sprint 1 🔻 9		12	7				4				
ID		Área Principal	Titulo Identificación Tarea	Tipo tarea	Prioridad	Complejidad	Estimación en Horas	Fecha programada de entrega	Fecha de inicio real	Días desde inicio	Estado tarea	Avance	Fecha cambio de estado	Bitácora de observaciones
1	©	Administrativas 🔻	Desarrollo Poduct BackLog	General ▼	MEDIA ▼	13 🔻	6	2022-09-09	2022-09-06	7	Finalizada	100%	13/sept/22 10:03	
2	Ø	Administrativas 🔻	Creación Repositorio	General ▼	MEDIA ▼	3 ▼	2	2022-09-13	2022-09-09	4	Finalizada 🔻	100%	13/sept/22 20:01	
3	ø	Configuraciones 🔻	Gestión de configuración	General ▼	BAJA ▼	2 🔻	3	2022-09-14	2022-09-08	5	Finalizada 🔻	100%	13/sept/22 21:06	
4		Documentación 🔻	Historias de usuario sprint 1	HU Ψ	ALTA ▼	5 🔻	4	2022-09-15	2022-09-08	5	Finalizada 🔻	100%	13/sept/22 12:12	
5		Documentación 🔻	Interfaz gráficas de usuario	MVC ~	MEDIA ▼	13 🔻	5	2022-09-12	2022-09-10	3	Sin empezar	10%	13/sept/22 21:57	
6		Documentación 🔻	Navegación entre interfaz	MVC ~	MEDIA ▼	13 🔻	5	2022-09-15			Sin empezar	0%		
7		Documentación 🔻	Informe de retrospectiva	General ▼	ALTA ▼	5 🔻	4	2022-09-18	2022-09-09		En Desarrollo	30%	13/sept/22 21:57	Se actualiza permanentemente
8		Documentación 🔻	Historias de usuario sprint 2	HU ▼	BAJA ▼	5 🔻	4	2022-09-18			Sin empezar	0%		
9	•	Documentación 🔻	Capacitación Scrum	General ▼	ALTA ▼	2 🔻	2	2022-09-15			Sin empezar	0%		

#### 4. Historias de usuario

Control de historias de usuario y seguimiento de tareas por Trello mediante metodología kamban, se desarrollan 8 historias de usuario, registradas de la siguiente manera.













Criterios de aceptación

### **HISTORIA DE USUARIO**

			Enunciado de la historia			
ID	сомо	QUIERO	PARA	Sprint	Prioridad	Estimación en Horas
HU1	Gestor del Proyecto	Definir el Product BackLog	Realizar una archivo en en hojas de google, que permita identificar la dinamica de utilización del product backLog para el proyecto MisiónTic, que pequeñas tareas automatizadas, esto permite generar una investigación de esta herramienta scrum.	1	MEDIA <b>▼</b>	6
HU2	Gestor del Proyecto	Creación Repositorio	Realización de un repositorio en GitHub, donde se trabajará el proyecto, creación de cuenta e instalación de GitHub	1	MEDIA ▼	2
HU3	Gestor del Proyecto	Gestión de configuración	Realización de la configuración de nuestro VS Code, con el fin de facilitar el desarrollo del proyecto, se realizará la investigación para buscar herramientas que se puedan integrar para facilitar el trabajo y nuestro entorno de programación.	1	BAJA ▼	3
HU4	Gestor del Proyecto	Historias de usuario	Realización de las historias de usuario del Sprint 1, controlado desde el BackLog y utilizando Tello para el seguimiento	1	ALTA <b>▼</b>	4
HU5	Gestor del Proyecto	Interfaz gráficas de usuario	Realizar un bosquejo de como sería la interfas gráfica del aplicativo	1	MEDIA   ▼	5
HU6	Gestor del Proyecto	Navegación entre interfaz	Realizar un bosquejo de como sería la navegación entre interfaces gráfica del aplicativo	1	MEDIA ▼	5
HU7	Gestor del Proyecto	Realización del informe de avance del Sprint, este informe se debe perfeccionar en el archibo del backlog, con el fin de automatizar datos.		ALTA <b>▼</b>	4	
HU8	Gestor del Proyecto	Historias de usuario	Realizar las historias de usuario ára el sprint 2	1	BAJA ▼	4










De igual forma estas historias, quedan registradas en como actividades por el equipo programador en el backlog y se realiza el seguimiento de las tareas por trello.

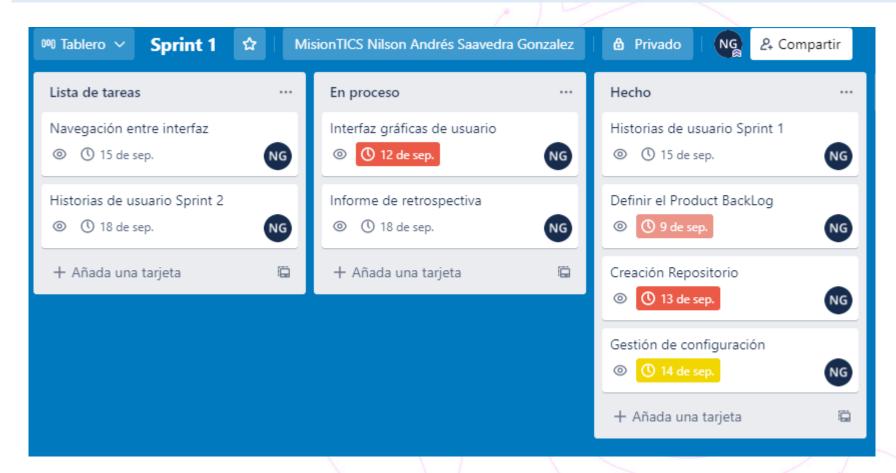








#### 5. Creación del repositorio Github

Se crea el repositorio GitHub "MisionTicCiclo3" con el usuario Git Sago0330, dirección del repositorio: https://github.com/Sago0330/MisionTicCiclo3.git

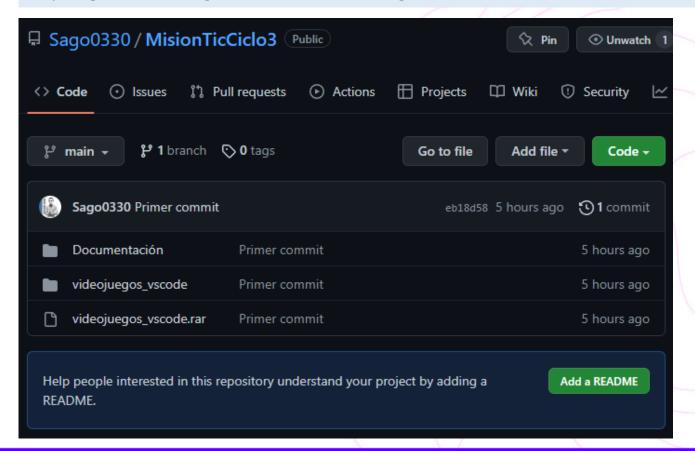









#### 6. Gestión de configuración

Se realiza una investigación para utilizar las mejores herramientas para el desarrollo del aplicativo utilizando VS CODE junto con la integración de GitHub relacionadas a continuación:



<b>€</b>	One Dark Pro Atom's iconic One Dark theme for Visual Studio Code	<b>3</b> 331	ms	
<u>~</u>	Maven for Java Manage Maven projects, execute goals, generate project from an	ి 20r chety. ఁ⊡ {		
	Material Icon Theme  Material Design Icons for Visual Studio Code	" <b>∑</b> 10r	ms 😘	
MI PDI	Markdown PDF Convert Markdown to PDF yzane	Ę	<b></b>	
M↓	Markdown All in One All you need to write Markdown (keyboard shortcuts, table of co Yu Zhang	ntents ແ□ {	-	
<b>((•)</b> )	<b>Live Server</b> Launch a development local Server with live reload feature for sta Ritwick Dey			
•	Language Support for Java(TM) by Red Hat Java Linting, Intellisense, formatting, refactoring, Maven/Gradle s Red Hat	® 84r uppor tt□ {		
ø	Jupyter Notebook Renderers Renderers for Jupyter Notebooks (with plotly, vega, gif, png, svg, Microsoft		 33	
jupyter	Jupyter Keymap Jupyter keymaps for notebooks  Microsoft	ę	<b></b>	
jupyter 2	Jupyter Jupyter notebook support, interactive programming and comput	ing th ៧□   {	_	













### 6. Mockups interfaz

Se recrearan dos ventanas de navegación para el proyecto de portafolio de muebles, el cual tendrá una ventana para el registro y otra de visualización del catalogo.

#### Ventana de registro producto



#### Ventana Visualización producto











#### 7. Historias de usuario sprint 2



Criterios de aceptación

### HISTORIA DE USUARIO

ID ≟	COMO <del>=</del>	QUIERO =	QUIERO = PARA = Sprint		Prioridad =	stimación en Hor≀ \Xi
HU9	Gestor del Proyecto	Capacitación Scrum	Realización CURSO ONLINE GRATUITO Scrum Fundamentals	2	BAJA ▼	2
HU10	Usuario	Creación interfaz registro	Creación de una herramienta que permita al usuario registrar los muebles, incluyendo título, descripción y una fotografria	2	ALTA <b>▼</b>	8
HU11	Usuario	Creación interfaz Catalogo	Creación de una pagina que permita visualizar el catálogo de los muebles regristrador por el usuario	2	MEDIA ▼	10
HU12	Usuario	Diseño logo	Creación de un logo que identifique el proyecto	2	BAJA ▼	5
HU13	Gestor del Proyecto	Informe de retrospectiva sprint 3	' I se debe perfeccionar en el archipo del backlog, con el fin d		BAJA ▼	4
HU14	Gestor del Proyecto	Historias de usuario sprint 3	Realizar las historias de usuario ára el sprint 3	2	BAJA ▼	4







#### 8. Informe de retrospectiva



10TTVID 10E0	, i	Se realization los Mockups utilizando la nerramienta onime <u>wiretramepro.mocknow.com</u> .
ACTIVIDADES	2	Todas las actividades se realizaron dentro del cronograma planeado, solo la actividad No. 8 del Backlog Capacitación Scrum, no se realizó, esta
IMPORTANTES		queda incluida en el sprint 2, se realizará una busqueda para tomar un curso basico online.
I'll OKTARTES	3	Se da cierre del Sprint 1 el día planeado 18 sep 2022, con la realización de 8 actividades, 1 actividad se traslada al sprint 2





#### MinTIC

# **Sprint 1**





#### 8. Culminación 100% Backlog

Mision TIC 2022			Cantidad	de tareas	Duración	Transcurrido				Finalizada 🔻						
			PRODU	Sprint 1 - 8		12	12				8					
ID	Plan de Trabajo		Área Principal	Titulo Identificación Tarea	Tipo tarea	Prioridad	Complejidad	Estimación en Horas	Fecha programada de entrega	Fecha de Días desde inicio real inicio		Estado tarea	Avance	Avance Fecha cambio de estado		Bitácora de observaciones
1	Sprint 1 🔻	Ø	Administrativas •	Desarrollo Poduct BackLog	General ▼	MEDIA ▼	13 🔻	6	2022-09-09	2022-09-06	12	Finalizada 🔻	100%		13/sept/22 10:03	
2	Sprint 1 🔻	©	Administrativas	Creación Repositorio	General 🔻	MEDIA ▼	3 ₹	2	2022-09-13	2022-09-09	9	Finalizada 🔻	100%		13/sept/22 20:01	
3	Sprint 1 ▼	<b>o</b>	Configuraciones	Gestión de configuración	General ▼	BAJA ▼	2 -	3	2022-09-14	2022-09-08	10	Finalizada 🔻	100%		13/sept/22 21:06	
4	Sprint 1 🔻	0	Documentación 🔻	Historias de usuario sprint 1	HU ₹	ALTA ▼	5 🔻	4	2022-09-15	2022-09-08	10	Finalizada 🔻	100%		13/sept/22 12:12	
5	Sprint 1 🔻	0	Documentación -	Interfaz gráficas de usuario	MVC =	MEDIA ▼	13 🔻	5	2022-09-12	2022-09-10	8	Finalizada 🔻	100%		18/sept/22 14:24	
6	Sprint 1 ▼	0	Documentación 🔻	Navegación entre interfaz	MVC *	MEDIA ▼	13 🔻	5	2022-09-15	2022-09-14	4	Finalizada 🔻	100%		18/sept/22 14:24	
7	Sprint 1 🔻	0	Documentación •	Informe de retrospectiva	General *	ALTA ▼	5 🕶	4	2022-09-18	2022-09-09	9	Finalizada 🔻	100%		18/sept/22 14:33	Se actualiza a medida que se progresa en las actividades
8	Sprint 1 ▼	0	Documentación •	Historias de usuario sprint 2	HU ▼	BAJA ▼	5 ▼	4	2022-09-18	2022-09-18	0	Finalizada 🔻	100%		18/sept/22 12:26	

9. Culminación 100% seguimiento actividades Trello



